



PORTS OF SAVONA-VADO (R)EVOLUTION

*Le opere per il territorio e
i cantieri avviati*

15 Febbraio 2022



DATI DI TRAFFICO E RAIL RATIO

	2019	2020	2021	2021vs19	2021vs20
NAVI ARRIVATE (n)	2.112	1.558	1.803	-14,63%	15,73%
TRAFFICO CONTAINERIZZATO (t)	534.269	1.533.042	2.605.882	387,75%	69,98%
TRAFFICO CONVENZIONALE (t)	5.075.760	4.193.501	4.823.246	-4,97%	15,02%
RINFUSE SOLIDE (t)	2.483.075	1.568.584	1.759.787	-29,13%	12,19%
OLI MINERALI (t)	6.239.589	5.915.422	5.559.913	-10,89%	-6,01%
ALTRE RINFUSE LIQUIDE (t)	60.046	75.039	106.608	77,54%	42,07%
TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE (t)	14.392.739	13.285.588	14.855.436	3,21%	11,82%
TOTALE GENERALE (inclusi bunkers) (t)	14.461.907	13.347.249	14.906.994	3,08%	11,69%
TOTALE CONTAINER (TEU)	54.542	146.081	223.265	309,35%	52,84%
Numero carri ferroviari (n)	14.278	14.552	21.233	48,71%	45,91%
RAIL RATIO %	3%	19,60%	19,63%		
TRAGHETTI (pax)	360.270	145.993	218.877	-39,25%	49,92%
CROCIERE (pax)	668.900	75.568	175.005	-73,84%	131,59%
TOTALE PASSEGGERI (pax)	1.029.170	221.561	393.882	-61,73%	77,78%

- Il volume complessivo è già oltre quello del 2019, grazie allo sviluppo dei traffici containerizzati
- La quota di trasporto intermodale verso l'hinterland è assestata sul 20%
- Il traffico di merce varia ha recuperato oltre 600.000 tonnellate nel 2021
- Resta un gap sugli oli minerali (greggio e derivati), per i quali a livello globale è in atto una riflessione nell'ambito della cosiddetta «transizione ecologica»



100 M€

Cantieri in corso
Programmazione Ordinaria



34

Interventi
in programma

40 M€

Nuovi investimenti
Programmazione Ordinaria 2022



15

Cantieri
in corso



9

Opere
aggiudicate
nel 2021






PORTS OF GENOA Gli interventi su Savona Vado

DESCRIZIONE	IMPORTO	FASI COMPLETATE	AVANZAMENTO
A) LAVORI IN PORTO			
Nuova diga di Vado Ligure - FASE 1	77.900.000,00€	Affidamento lavori	Lavori in corso
Rifiorimenti dighe a gettata Savona e Vado	10.150.000 €	Affidamento lavori	Lavori in corso
Ripristino piazzale terrapieno Sud Savona	3.500.000 €	Affidamento lavori	Lavori in corso
Manutenzione straordinaria banchine Savona	550.000 €	Aggiudicazione lavori	Avvio lavori 1 trim. 2022
Manutenzione straordinaria pontili zona 4 Savona	450.000 €	Aggiudicazione lavori	Avvio lavori 1 trim. 2022
Ripristino piazzale Margonara Albissola Marina	900.000 €	Affidamento lavori	Lavori in corso
Ripristino terminal traghetti Vado	6.620.000 €	Prog. esecutiva	Conferenza dei servizi
B) ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE			
Interconnecting tubazioni petroli torrente Segno	7.000.000 €	Conclusa CdS MISE	In attesa provvedimento finale CdS
Messa in sicurezza torrente Segno	15.000.000 €	Prog. definitivo	Procedimento di Intesa Stato Regione A seguire: gara affidamento appalto integrato
Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44	20.000.000 €	Contratto	Lavori in corso
Sistemazione viabilità per ampliamento terminal intermodale	20.000.000 €	Prog. definitivo	Gara affidamento appalto integrato in corso
Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena	4.500.000 €	Progetto definitivo	Verifica di non assoggettabilità a VIA conclusa A seguire: Intesa Stato Regione
C) ALTRE OPERE			
Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure	1.950.000,00 €	Contratto	Lavori in corso
Realizzazione struttura «Progetto Terrapieno di Zinola» Savona	900.000,00 €	Realizzazione opere	Collaudo Affidamento demaniale gestione delle strutture
Potenziamento pesca professionale nel porto di Savona	350.000,00 €	Contratto	Lavori in corso
Cold ironing terminal crociere nel porto di Savona	10.100.000 €	Progetto definitivo	Gara per affidamento appalto integrato in corso



▣ P.742 - NUOVA DIGA DI VADO LIGURE - FASE 1

IMPORTO	77.900.000,00€
STATO DELL'ARTE	Lavori in corso
FINE LAVORI PREVISTA	Giugno 2025
APPALTATORE	FINCOSIT 

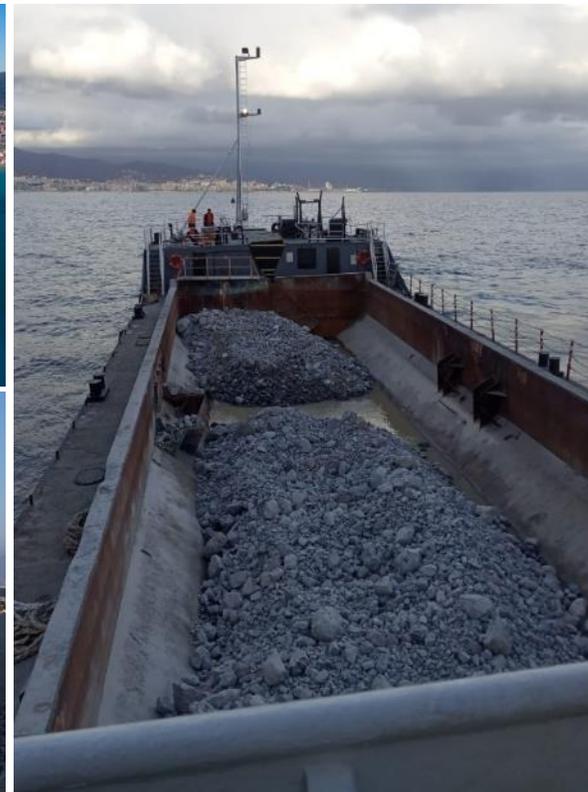




▣ P.768 – RIFIORIMENTI DIGHE A GETTATA SAVONA E VADO LIGURE

IMPORTO	10.150.000,00 €	FINE LAVORI PREVISTA	Novembre 2023
STATO DELL'ARTE	Lavori in corso	APPALTATORE	 CEM COSTRUZIONI SPA specializzati in costruzioni edili e marittime

VADO LIGURE



SAVONA

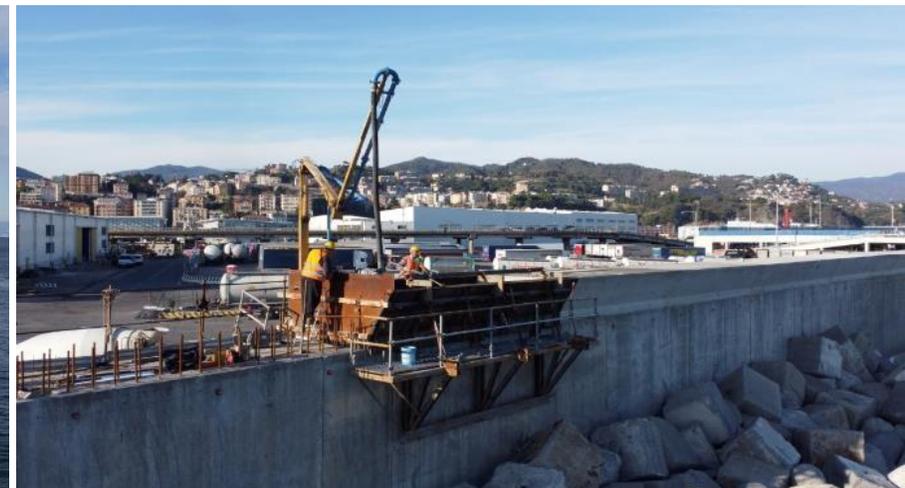

▣ P.770 lotto 2 - RIPRISTINO PIAZZALE TERRAPIENO SUD

IMPORTO	3.500.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori in corso
FINE LAVORI PREVISTA	Agosto 2022
APPALTATORE	CARDI s.r.l. CAVE - MOVIMENTO TERRA





▣ P.773 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINE

IMPORTO	550.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori aggiudicati - Contrattualizzazione in corso
TEMPISTICA	Avvio dei lavori previsto entro fine marzo 2022
APPALTATORE	SORRENTO SUB SERVICE S.R.L.



▣ P.784 - RIPRISTINO VIABILITÀ DEPOSITI COSTIERI

IMPORTO	1.000.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori completati
APPALTATORE	



▣ P.769 - RIPRISTINO TERMINAL TRAGHETTI

IMPORTO	6.620.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Chiusura Conferenza dei Servizi entro fine febbraio 2022
TEMPISTICA	Avvio lavori estate 2022

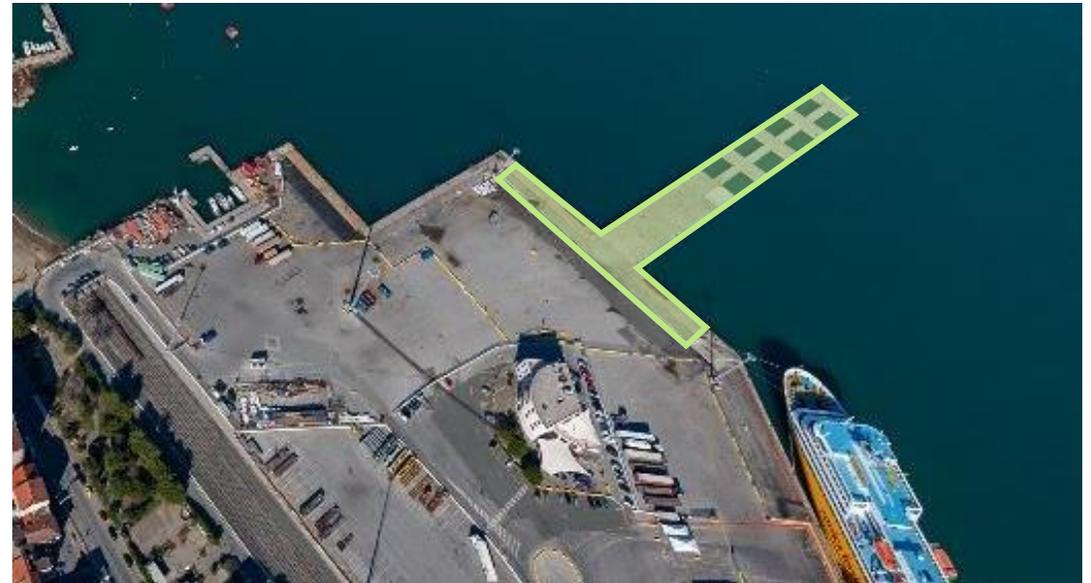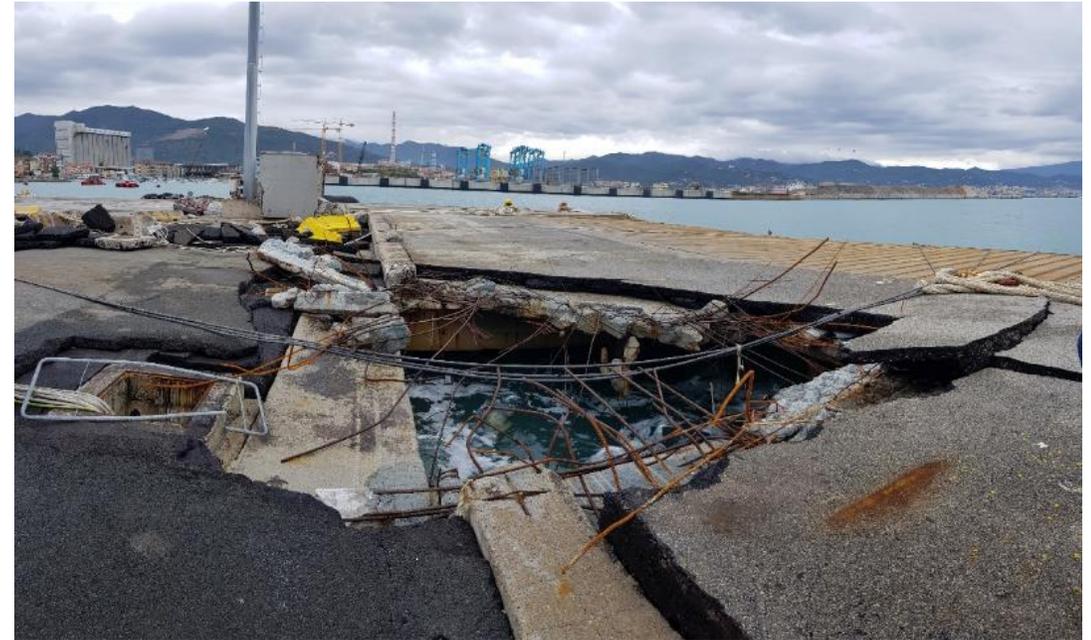



▣ P.740 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLA DARSENA DI SAVONA

IMPORTO	350.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori consegnati
FINE LAVORI PREVISTA	Estate 2022
APPALTATORE	





▣ P.782 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SANT'ELENA PER IL TRATTO INTERESSATO DAL SOVRAPPASSO STRADALE ESCLUSO IL TRATTO SOTTOSTANTE LA SSI AURELIA

IMPORTO	4.500.000,00 €
STATO DELL'ARTE	In corso progettazione definitiva Conclusa verifica di non assoggettabilità a VIA
TEMPISTICA	Avvio gara luglio 2022



▣ P.711 - OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL PORTO DI VADO LIGURE PER AMPLIAMENTO TERMINAL INTERMODALE - 2ª FASE RACCORDO FERROVIARIO

IMPORTO	20.000.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Pubblicata gara per appalto integrato
TEMPISTICA	Avvio lavori previsto per settembre 2022




▣ P.644 - INTERCONNECTING TUBAZIONI PETROLI

IMPORTO	7.000.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Conferenza dei Servizi in conclusione con autorizzazione MISE ex art.57 Legge 35/2012 (di concerto con il MIMS previa intesa con Regione Liguria)
TEMPISTICA	Avvio gara 2° trimestre 2022

▣ P.707 - MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SEGNO

IMPORTO	15.000.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Conferenza dei Servizi in conclusione presso il Provveditorato OO.PP. ex art. 2-3 DPR 383/1994
TEMPISTICA	Avvio gara 2° trimestre 2022

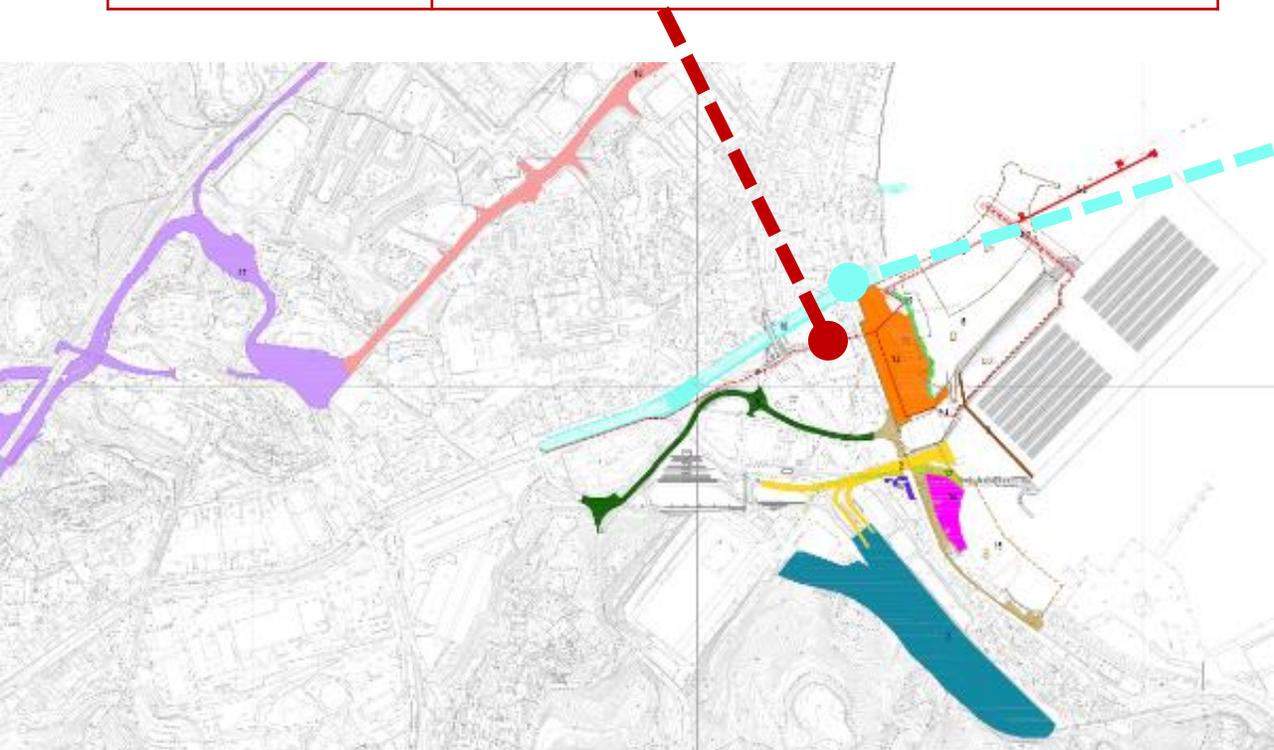



▣ P.755 - INTERVENTO STRUTTURALE A DIFESA DELLA COSTA DI VADO LIGURE

IMPORTO	1.950.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori in corso
FINE LAVORI PREVISTA	Maggio 2022
APPALTATORE	Idresia Infrastrutture.it





INTERVENTI ALBISSOLA MARINA



▣ DEMOLIZIONE EX BAGNI MADONNETTA E SISTEMAZIONE ACCESSO

STATO DELL'ARTE

Lavori completati





▣ P.775 - RIPRISTINO PIAZZALE MARGONARA

IMPORTO	900.000,00 €
STATO DELL'ARTE	Lavori in corso
FINE LAVORI PREVISTA	Maggio 2022
APPALTATORE	 CEM. CEM COSTRUZIONI SPA specializzati in costruzioni edili e marittime



▣ PONTILE (intervento Comune di Albissola Superiore)




▣ P.637.1 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO STRUTTURA 'PROGETTO TERRAPIENO DI ZINOLA'

IMPORTO	900.000,00 € a carico di AdSP
STATO DELL'ARTE	Lavori terminati In avvio bando per affidamento gestione
APPALTATORE	 D.I.GI.ALL. S.R.L.  D.I.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO



Fabbricato Bar ▶
Fabbricato servizi igienici ▼



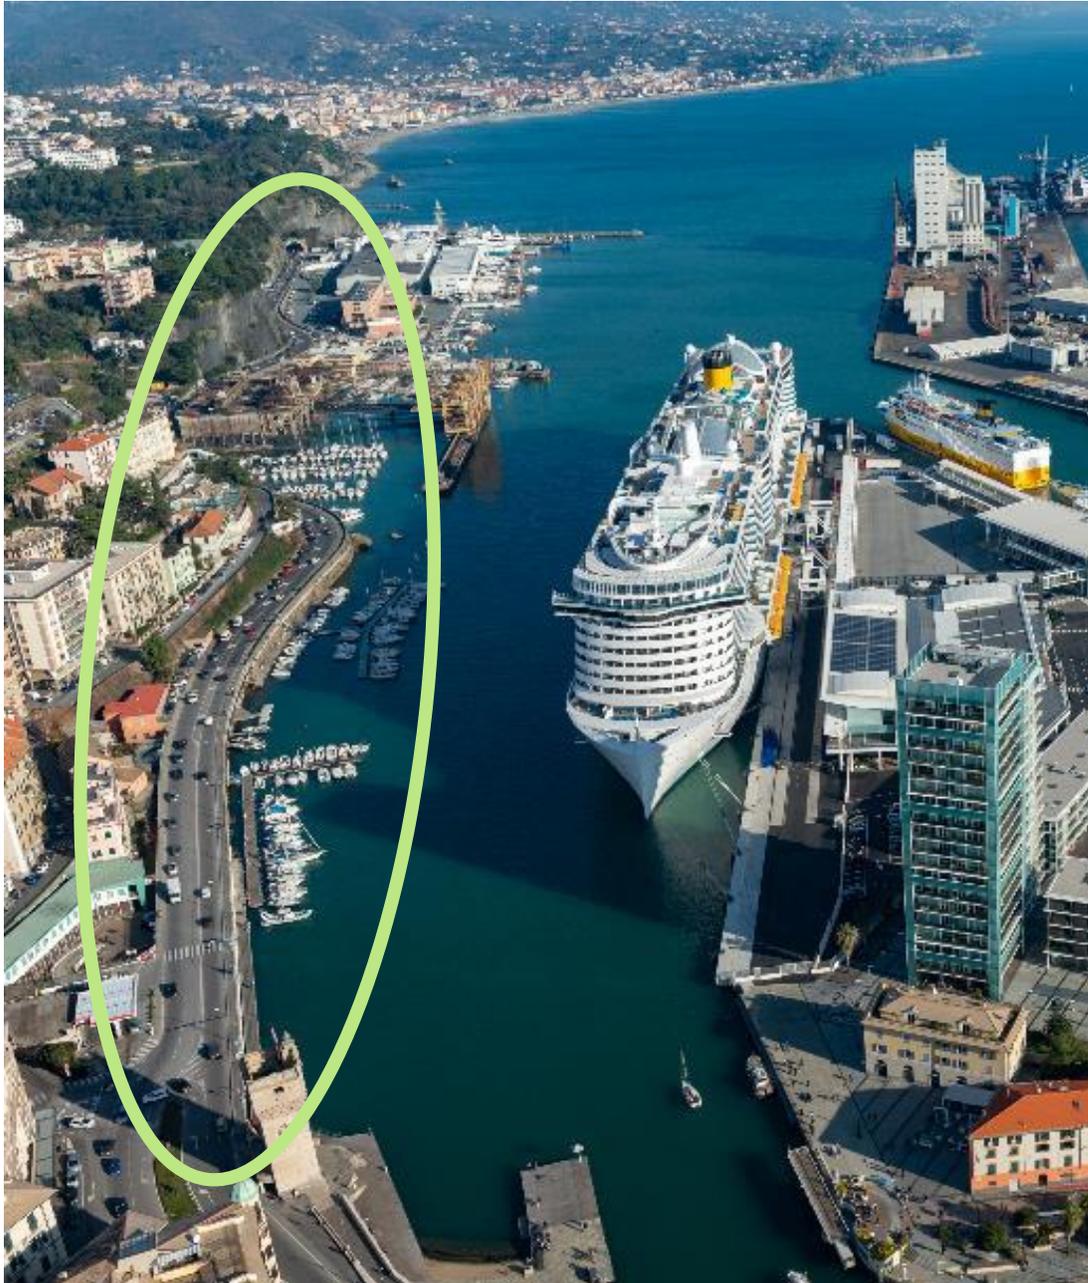

▣ PERCORSO CICLO-PEDONALE SAVONA - ALBISSOLA MARINA CON RIQUALIFICAZIONE AREA EX FUNIVIE, MOLO MIRAMARE E ATTENZIONE ALLE AREE RELATIVE ALLO SVINCOLO DELL'AURELIA BIS

- Intervento previsto nel DPSS
- Progetto finanziato dalla Regione e realizzato da IRE sulla base delle interlocuzioni in corso con il territorio.
- Costo stimato 4 ML di euro (su opera a sbalzo in struttura propria)
- Sono in corso incontri tra AdSP, Comune di Savona e Albissola Marina propedeutici alla progettazione e la mappatura delle attività presenti sul territorio
- Previsto percorso esterno alla galleria Valloria



RICHIESTE DI FINANZIAMENTO BANDO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | € 25 milioni

Energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti di **Savona e Vado Ligure** da realizzarsi **entro il 2025**:

- **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- **PORT GRID**
- **INFRASTRUTTURE DI RICARICA**

Il **porto di Savona** sarà il **primo in Italia** in grado di autoprodotte l'energia utilizzata **riducendo notevolmente il proprio impatto sull'ambiente**, grazie all'attuazione degli interventi previsti con la richiesta di finanziamento al MITE.



BENEFICI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI DELLE OPERE

Prometeia ha stimato gli effetti generati dai lavori/cantieri su occupazione e valore aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni



SAVONA - VADO LIGURE

Occupazione diretta e indiretta: **1.300 unità**

Valore aggiunto diretto e indiretto: **700 milioni** di euro



- Estrema concentrazione del settore
- Fragilità finanziaria
- Rincarare costi materie prime e tecnologie di cantiere
- Bottle neck nelle supply chain
- Richieste di maggiori costi anche prima dell'avvio dei lavori per riserve sulla progettazione di gara e di contratto

Vanno rafforzate le stazioni appaltanti con risorse umane adeguate sotto il profilo economico finanziario, contrattuale-negoziale, tecnico-ingegneristico, project management

Va ripensata la natura giuridica delle autorità portuali, al momento non in grado di competere con il modello anseatico o fully private

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

WWW.PORTSOFGENOA.COM

